



TIPOS DE RELAÇÃO ENTRE AS ATIVIDADES

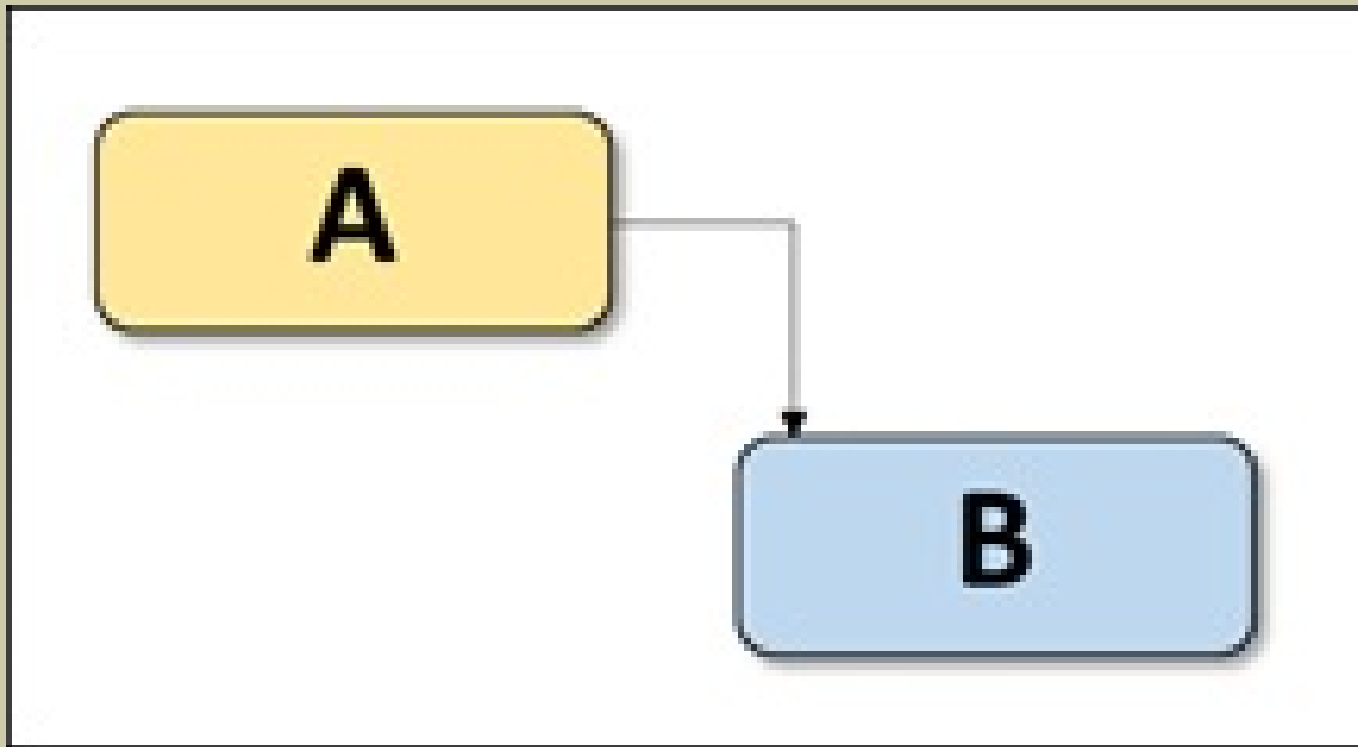


Término a Início

Primeiro é necessário abrir o buraco para a fundação (predecessora) e depois despejar o concreto (sucessora), uma não pode ser iniciada até que a outra seja concluída.

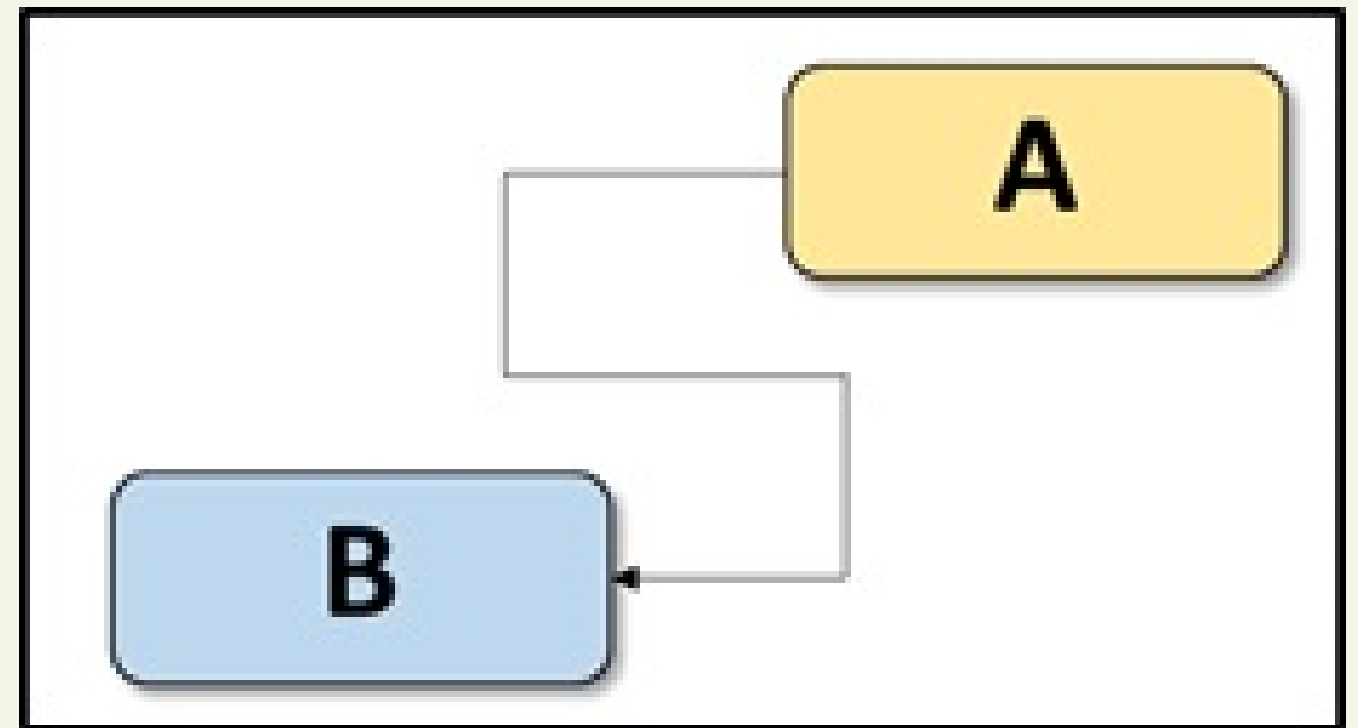


Início a Término

Na montagem de um telhado, onde as estruturas do telhado serão construídas num local diferente da obra, portanto não pode montar o telhado (sucessora) até que entrega da estrutura (predecessora) inicie.

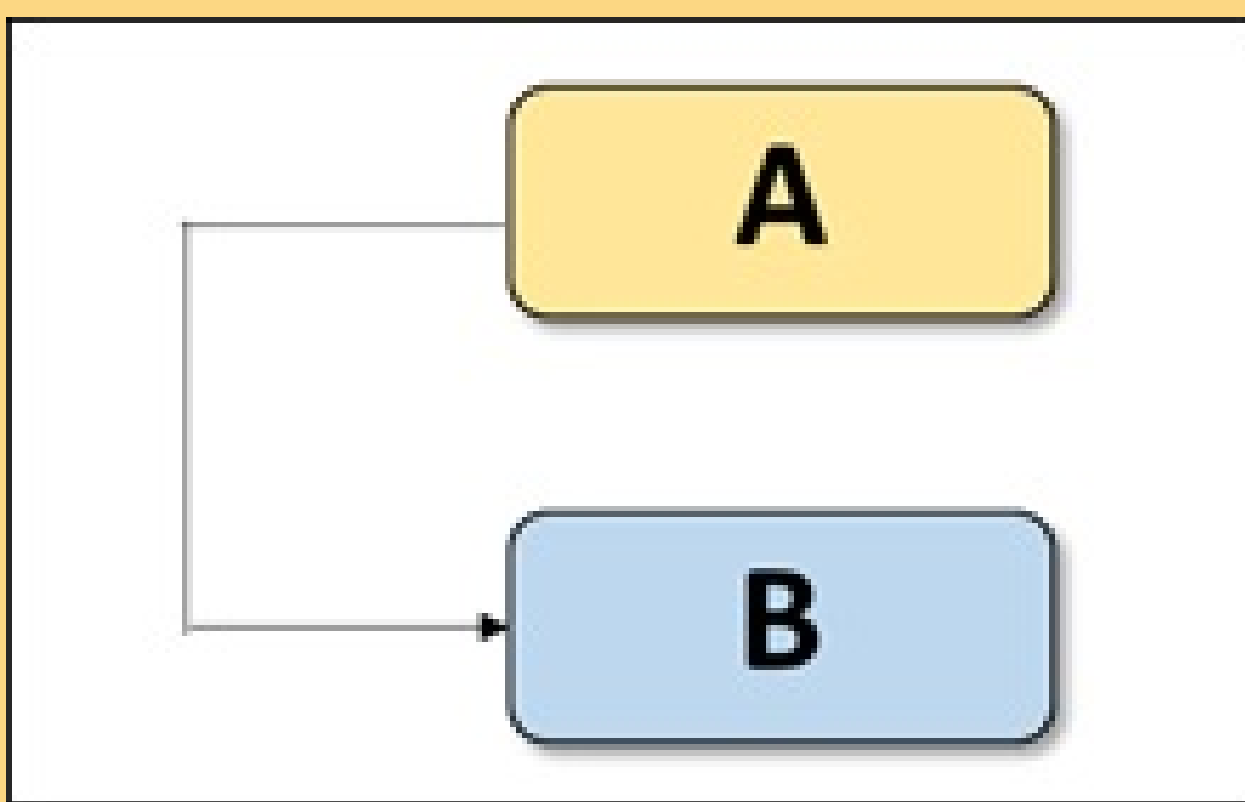

Início a Início

Na etapa da fundação, onde a tarefa de nivelar o concreto (sucessora) não pode ter início até que a colocação da fundação (predecessora) seja começada.

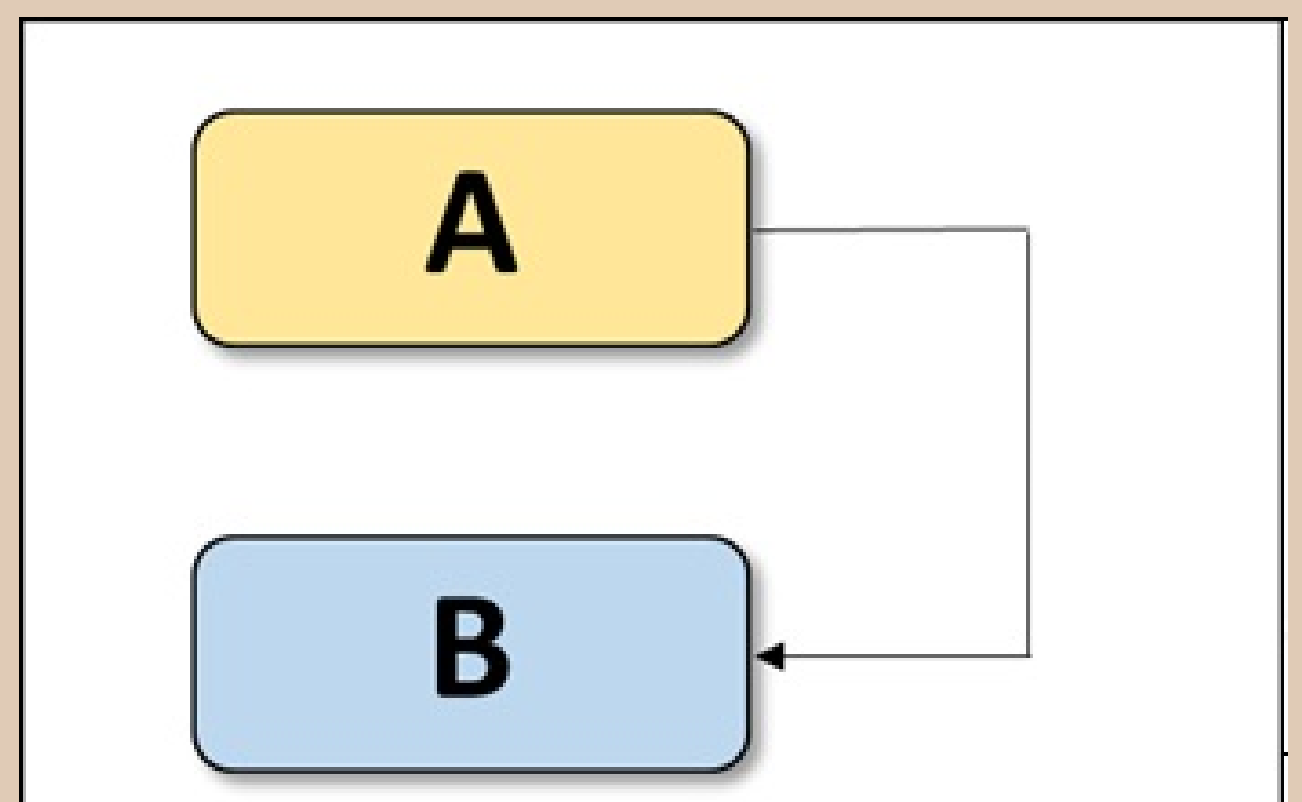

Término a Término

Na fase da instalação da fiação e inspeção sendo executadas de forma paralela, portanto até que finalize a fase de instalação da fiação (predecessora), não será possível concluir a inspeção das instalações elétricas (sucessora).
